



Desafío
Levantemos Chile



INFORME
**Proyectos Jardín Botánico
Nacional** - Abril 2025






Contexto

Emergencia Incendio V Región - Febrero 2024

Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

El **Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar** (JBN) tiene 404 hectáreas y es uno de los pulmones verdes más importantes de la Región de Valparaíso, albergando una gran diversidad de árboles, nativos y exóticos, palmas chilenas y árboles relacionados a proyectos con gran incidencia ecológica. Históricamente, el parque recibe a más de **400.000 visitantes al año**, siendo un punto de encuentro importante para la comunidad y turistas, generando encuentros sociales a través de actividades educacionales, trekkings y tours, además de variados convenios con colegios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y del mundo cultural, para potenciar el ámbito de la educación y conciencia medioambiental.

ANTES DEL INCENDIO

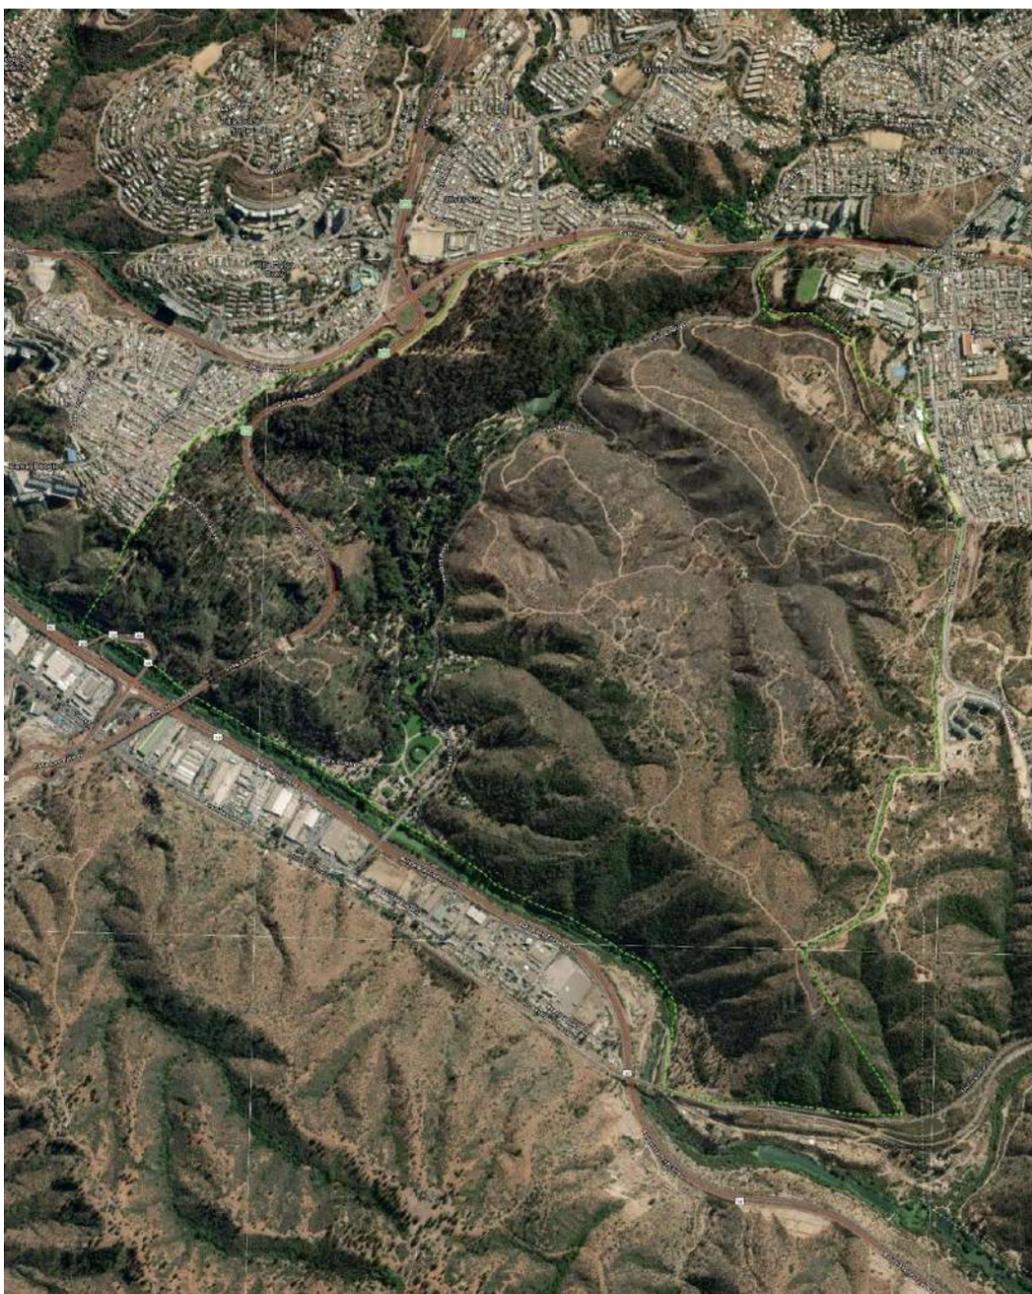


Producto de la magnitud del incendio del 2 de Febrero de en la V región, **se destruyó el 90% de la flora y fauna del parque**, espacio que a su vez tenía casas de trabajadores, el vivero principal del parque, sistema de riego, una cafetería, infraestructura de deporte aventura e infraestructura cultural.

Dada su relevancia socioeducativa y ambiental, se estableció un plan de acción de reconstrucción apoyado por el Consejo Minero, a través de Desafío Levantemos Chile como ejecutor y articulador entre los diversos actores relevantes que interactúan en Jardín.

DESPUÉS DEL INCENDIO



Este informe resume los proyectos que constituyen este plan de acción y sus avances, en los que participan 3 de las principales áreas de acción de la fundación Desafío Levantemos Chile: **Emergencia y Medio Ambiente, Desarrollo Social y Construcción.**



Soluciones



Proyectos y Avances Técnicos

Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar

Se ha desarrollado un plan de reconstrucción para el Jardín Botánico Nacional, centrado en los **ejes sociales, culturales y de emprendimiento** que caracterizan al parque. Este plan también reconoce su rol fundamental en la **recuperación medioambiental**, dado que el jardín es el pulmón más importante de la región. Las soluciones propuestas a continuación abordan las necesidades de apoyo post-emergencia, con el objetivo de recuperar y fortalecer la infraestructura afectada por el incendio del 2 de febrero de 2024, contribuyendo así a la restauración ecológica y al bienestar de la comunidad.

Presupuesto
\$984.000.000

Beneficiarios
+400.000*



DETALLE BENEFICIARIOS

Beneficiarios*:

- **Indirectos**

- ★ 400.000 Visitantes al año
- ★ 25.500 Visitantes Canopy y Muro de Escalada
- ★ 30.330 Estudiantes y Adultos Mayores

- **Directos**

- ★ 1 Representante correspondiente a Jardín Botánico de Viña del Mar
- ★ 10 Funcionarios y sus familias
- ★ 10 Trabajadoras de la cafetería
- ★ 15 Trabajadores Canopy y Muro de Escalada

*Datos en base a información proporcionada por encargados Jardín Botánico e información pública disponible en <https://jbn.cl/>




AVANCE SOLUCIONES


Proyecto	% Avance Operativo	% Avance Presupuestario
01. Reconstrucción Viviendas	100%	95%
02. Glorieta Simbólica	100%	100%
03. Centro de Visitantes	48%	26%
04. Cafetería	100%	100%
05. Canopy y Muro Escalada	100%	100%
06. Sistema de Riego	100%	100%
07. Vivero e invernadero	100%	100%
08. Reforestación 2024*	100%	100%
08. Reforestación 2025	10%	1,6%

*Primera etapa, 2024. Se realizará una segunda etapa en 2025

CARTA GANTT

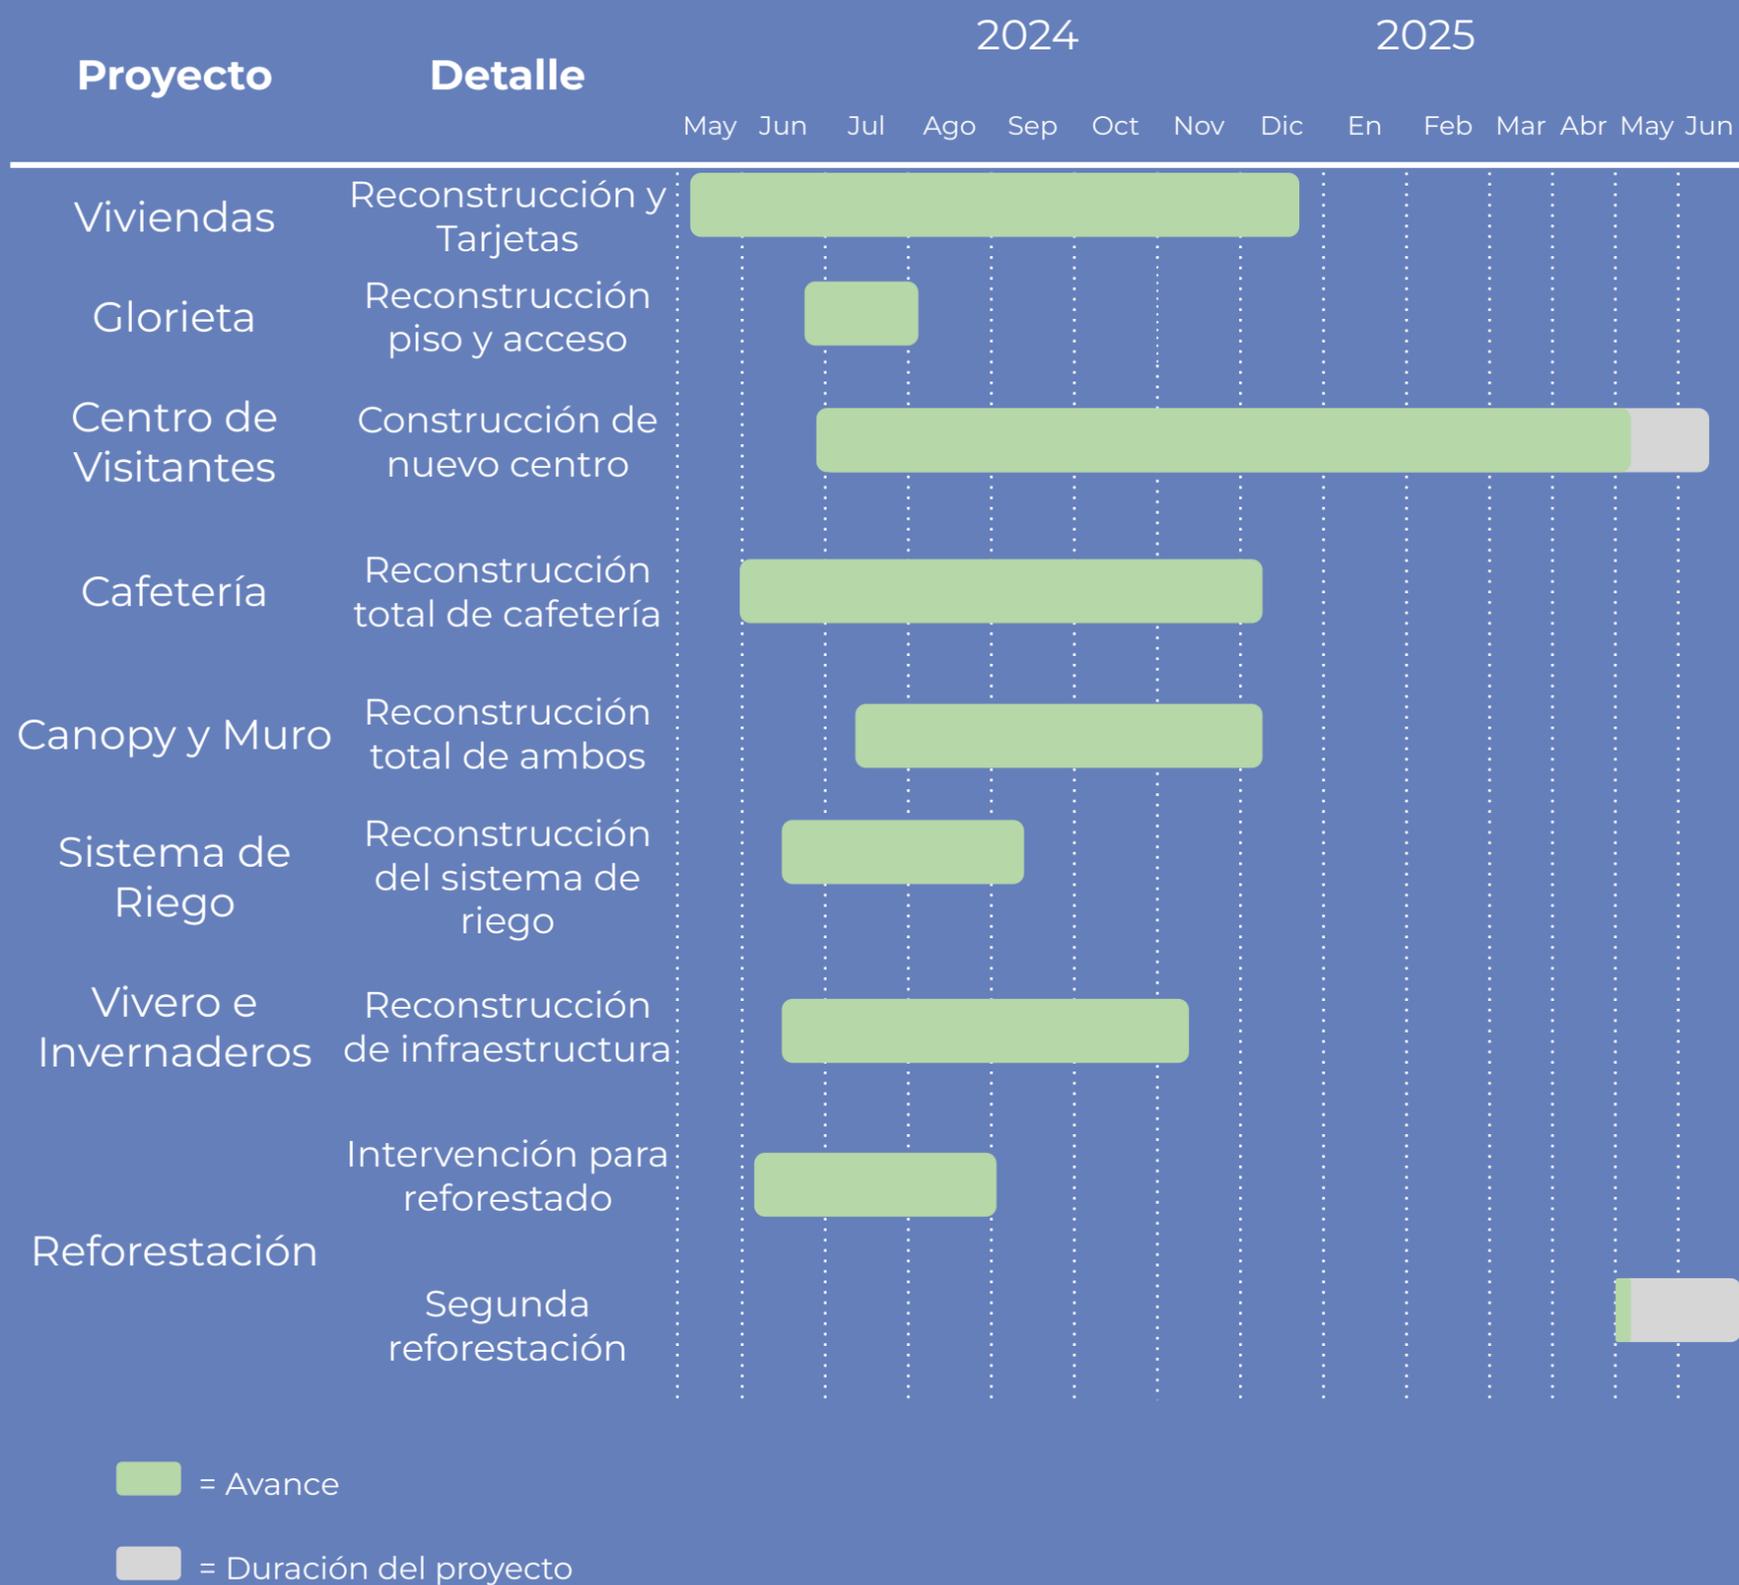

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2025

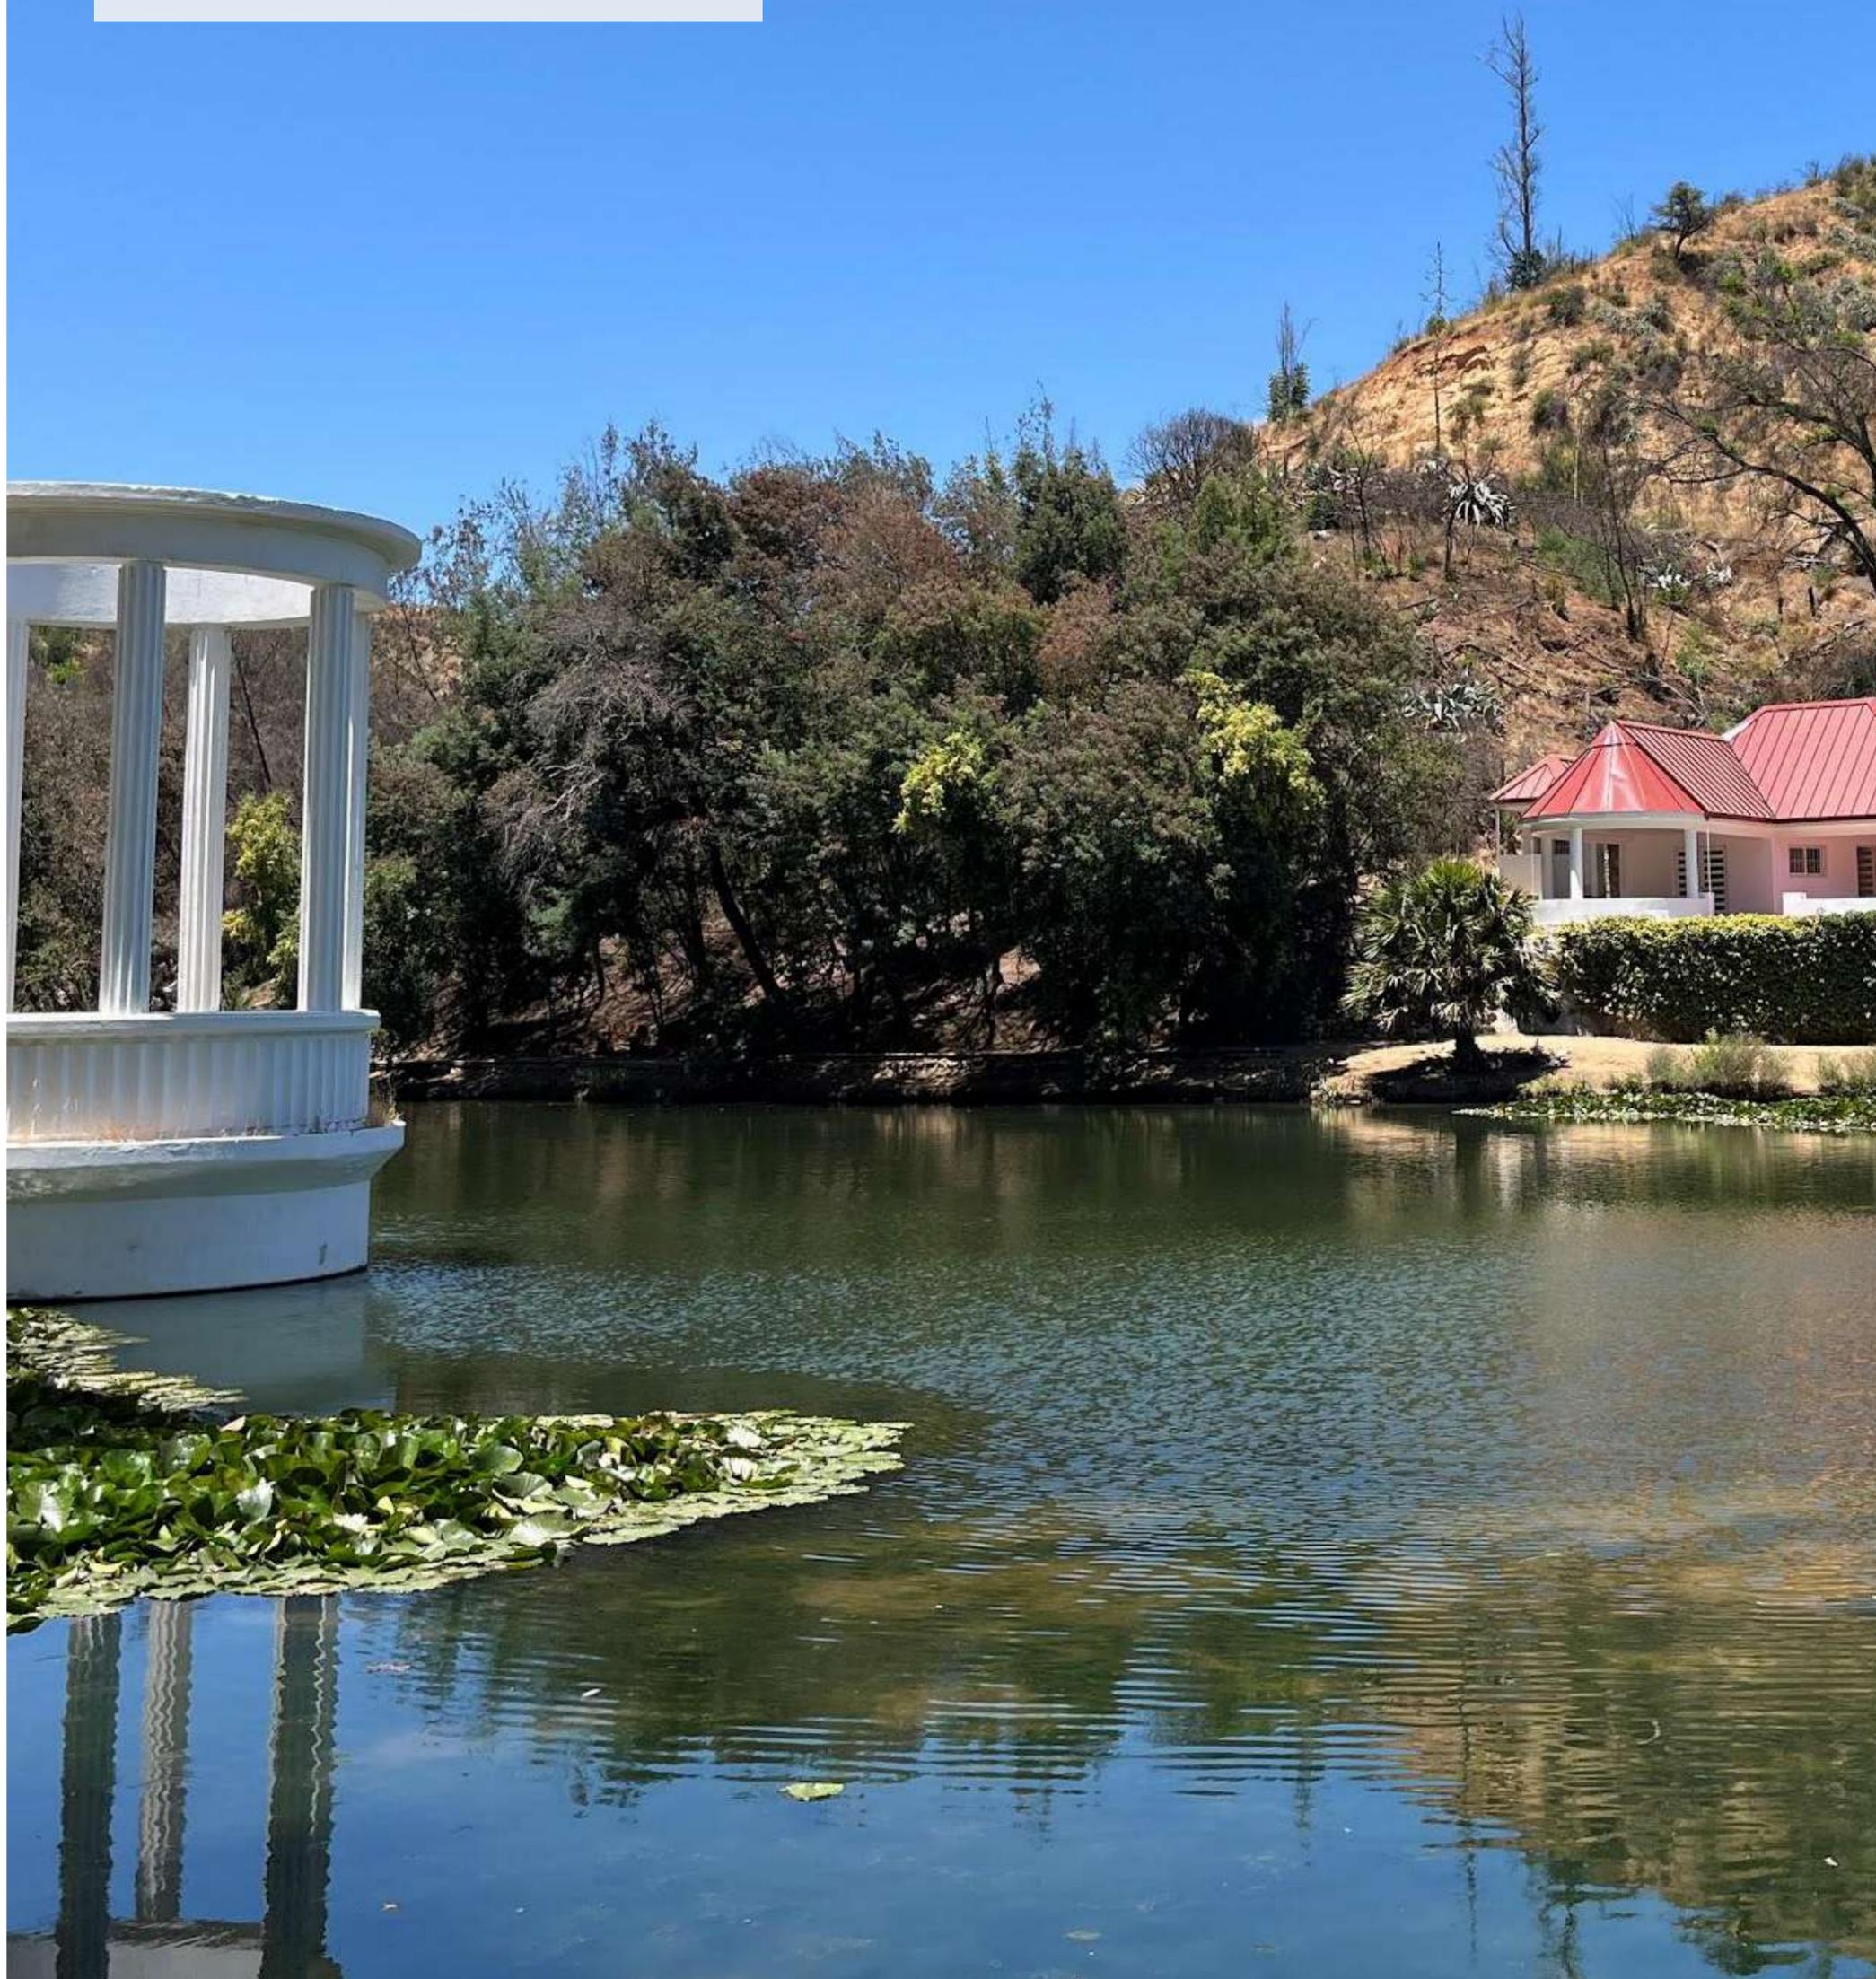

Centro de Visitantes





DETALLE SOLUCIONES

Centro de Visitantes e interpretación.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo centro de visitantes e interpretación para el Jardín Botánico Nacional, con el objetivo de fortalecer su triple rol fundamental: investigativo, educativo y cultural, además de contribuir a la profesionalización del parque y mejorar la experiencia de los visitantes. Este nuevo espacio estará diseñado para promover la interpretación y la educación ambiental.

La propuesta está compuesta por 4 módulos que se emplazarán en el corazón del parque, entre árboles y en cercanía del sector Cactario.

El diseño de esta obra comenzó en abril 2024 y se entregó la propuesta del diseño arquitectónico el 13 de septiembre de 2024 para luego ser aprobado por el directorio del Jardín Botánico a finales de diciembre.

Las obras dieron inicio el 10 de febrero de 2025.





CRONOLOGÍA INFRAESTRUCTURA

Abril 2025



04.06.2024

Revisión de posible imagen objetivo y esquemática.

31.07.2024

Propuesta de diseño de arquitectura por parte de UNAB.

13.09.2024

Se mantiene a la espera de aprobación el diseño de arquitectura por parte del directorio del JBN.

29.11.2024

Se recibe aprobación en directorio JBN.

13.12.2024

Propuesta de diseño de arquitectura por parte de UNAB:

Contempla una superficie aproximada de 500 m² de los cuales 200 m² corresponden a construcción de módulos de planta libre. Los 4 módulos serán levantados en paneles SIP.







CRONOLOGÍA INFRAESTRUCTURA

- 26.12.2024
Se encuentra programada la licitación.
- 17.01.2024
Entrega de presupuestos
- 24.01.2025
Adjudicación y contrato.

PLANTA ARQUITECTURA - ESCALA 1:50

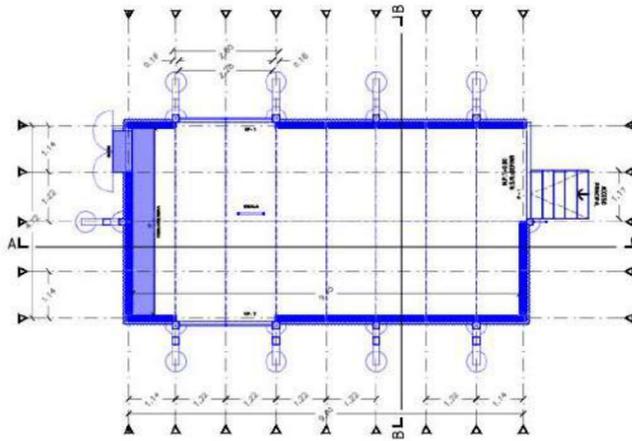

ELEVACIÓN LONG.

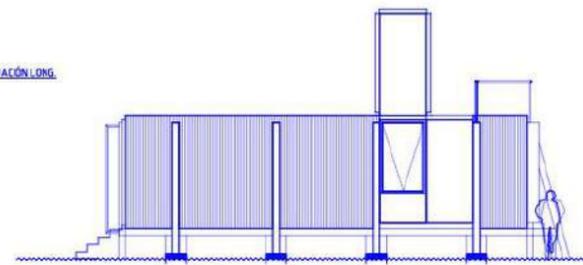

ELEV. ACCESO


ELEV. POSTERIOR



SECCIONES 1:1


- PARED PERIFÉRICA, ANGULO 100 x 100 x 4mm, ANILLO PLANA 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- DIVISORIO, BARRA 60 x 60 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- CORTAPISO CANTAL, BARRA PLANA 20 x 20 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- PARED INTERIOR, 100 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- TEMPORAL, BLOQUE 100 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- PARED 100 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.

ANILLO CARGO METÁLICO - ESCALA 1:15

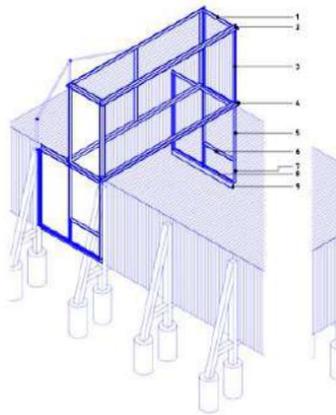

SECCIONES 1:1

- PARED PERIFÉRICA, ANGULO 100 x 100 x 4mm, ANILLO PLANA 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- DIVISORIO, BARRA 60 x 60 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- CORTAPISO CANTAL, BARRA PLANA 20 x 20 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- PARED INTERIOR, 100 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- TEMPORAL, BLOQUE 100 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.
- PARED 100 x 100 x 4mm, LARGOS VARIADOS.



PROYECTO ARQUITECTURA CENTRO DE VISITANTES J. ROTANICO

DT-P 1/3/4



CRONOLOGÍA AVANCES 2025

Abril 2025



10.02.2025

Inicio de obras. Identificación de Especies protegidas y sectores a intervenir, despeje de sector siniestrado, retiro de escombros y traslado a botadero autorizado




CRONOLOGÍA AVANCES 2025



Abril 2025



- 07.03.2025
Se emplaza propuesta de ubicación de los módulos, se desplazan los ejes de cada módulo a 30°, 85°, 145° y 200°, para no intervenir con Jardín de plantas Medicinales y caminos interiores.

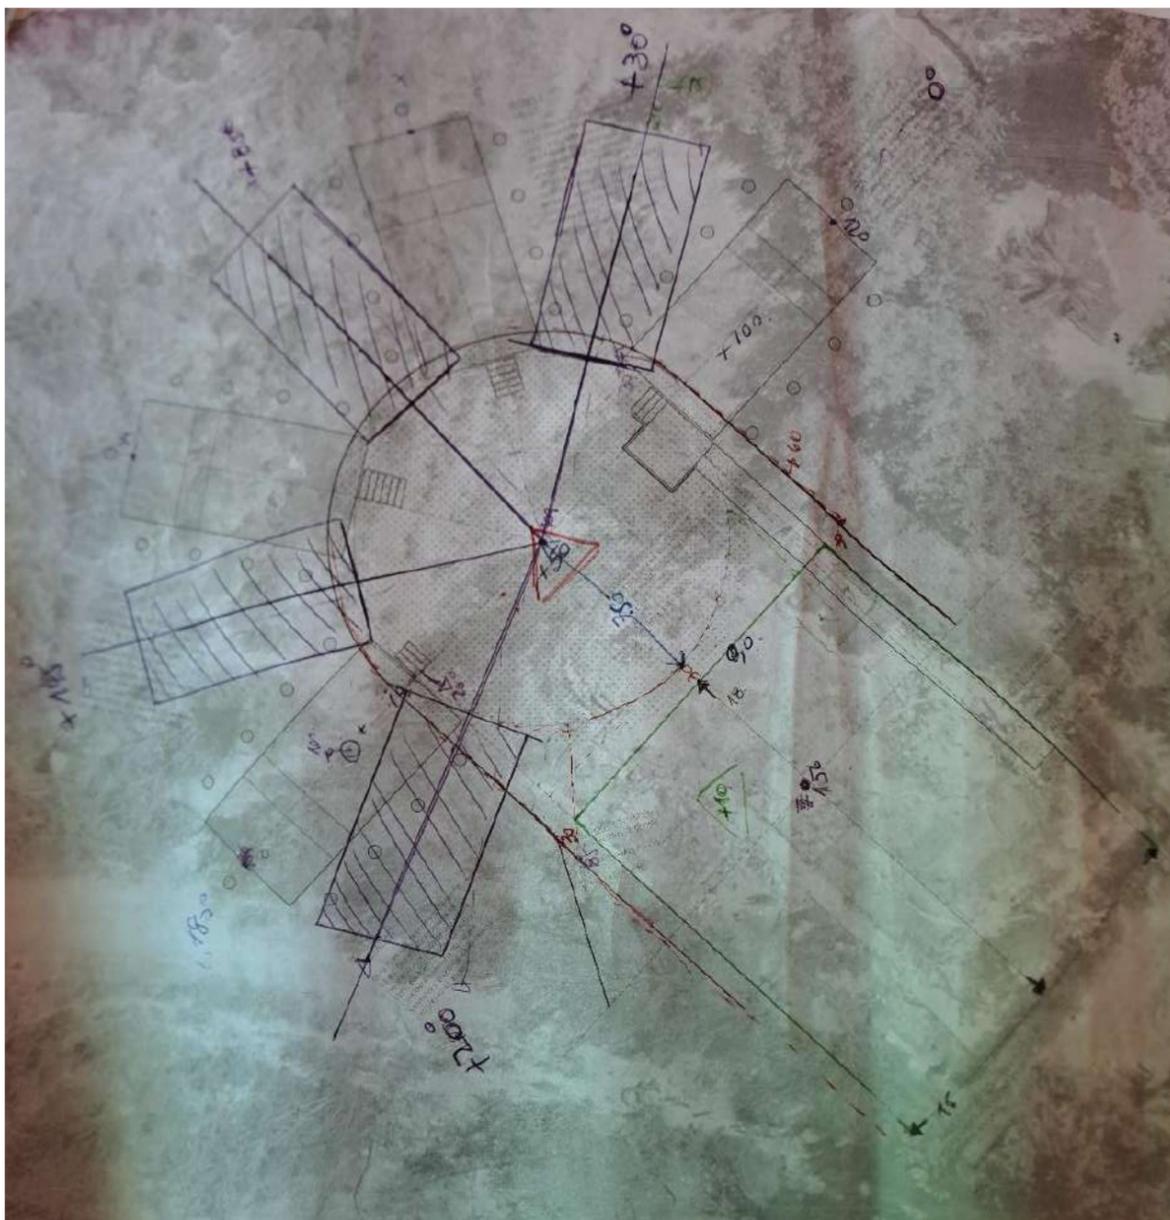



CRONOLOGÍA AVANCES 2025

Abril 2025



● 16.03.2025

Se hormigonan fundaciones y pilares de apoyo de segundo módulo.

Trazado de ejes y niveles de módulos 3 y 4, mediante confección de corral, niveletas y piolas, para excavación de fundaciones.

Se completa excavación para fosa séptica, dren y su respectivo relleno.





CRONOLOGÍA AVANCES 2025

Abril 2025



28.03.2025

Avance general de la obra.



25.04.2025

Instalación de diagonales en módulos 1 y 2 e instalación de techo módulo 2.



30.06.2025

Fecha estimada de **Reconstrucción** total



DESAFIOLEVANTEMOSCHILE.ORG

Reforestación





DETALLE SOLUCIONES

Reforestación

En 2024 se realizó la primera intervención en un sector del jardín destinado a la reforestación con árboles nativos. Esta acción se completó gracias a la activa participación de colaboradores, quienes contribuyeron en el proceso de reforestación con especies nativas.

Actualmente, se encuentra en fase de licitación la segunda etapa del proyecto de reforestación, la cual se ejecutará a partir del final de mayo. Con el objetivo de garantizar la supervivencia de los árboles y su adecuado establecimiento en el ecosistema. Esta fase incluye una estrategia integral de prevención, que abarca el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos con la mejora y ampliación de los estanques de acumulación de agua ubicados en la parte alta del sector conocido como Lote C.

La implementación de estas acciones no solo contribuirá a la recuperación y restauración de la biodiversidad local. Sino que también jugará un papel crucial en la mitigación de riesgos ambientales, como la erosión del suelo y la escasez de agua. Además, estas medidas son esenciales para asegurar la resiliencia del ecosistema frente a futuros eventos climáticos extremos, consolidando así el impacto positivo de la reforestación sobre el medioambiente y fortaleciendo las capacidades de adaptación del Jardín Botánico Nacional.





CRONOLOGÍA AVANCES

- 01.08.2024
Comienza plan de reforestación.
- 29.08.2024
Superficie total de reforestación de 5.000 m² con 10 especies de bosque nativo según lo contemplado.





CRONOLOGÍA AVANCES 2025

Abril 2025



04.02.2025

Se planifica visitas a terreno para el levantamiento de proyecto de reforestación 2025. El Jardín Botánico plantea: (a) reponer el trazado de abastecimiento de agua al lote C, que consiste en elevar desde el estero El Olivar el agua necesaria para el estanque de almacenamiento y distribución que se encuentra en el Lote C y (b) una segunda etapa para este proyecto, que contempla la reforestación con árboles nativos, que se llevaría a cabo a partir de Mayo 2025.

05.03.2025

Se abre propuesta a contratistas para el proyecto.

25.03.2025

Terminan las visitas de evaluación de terrenos por parte de contratistas para fase inicial de esta segunda etapa de reforestación, que se espera finalizar en Junio 2025.





CRONOLOGÍA AVANCES 2025

Abril 2025



25.04.2025

Se reciben últimas preguntas de parte de los contratistas. Se envía propuesta técnica a Jardín Botánico.

Se espera comienzo de ejecución de fase de riego y reforestación en el transcurso de la quincena de mayo.

30. 04.2025

Se revisó propuestas técnicas con JBN.

Se adjudica contratista para la solución de ambas partes del proyecto, el riego del Lote C y la reforestación.



Abril 2025

PROYECTOS ENTREGADOS 2024



Reconstrucción Viviendas





Viviendas a través de Reconstrucción y Entrega de Tarjetas de Reconstrucción

Se identificaron 10 trabajadores afectados, de los cuales 6 residían en sectores aledaños y 4 dentro del recinto del Jardín Botánico, cuyas viviendas fueron totalmente destruidas.

El plan de respuesta consistió en la entrega de **tarjetas** para: **(a) reconstrucción de viviendas y (b) reposición de enseres**, destinadas a las familias de los 10 trabajadores afectados.

Esta metodología garantizó que las familias tuvieran acceso a productos y materiales esenciales para su proceso de recuperación, alineándose con los objetivos de la estrategia de reconstrucción. Así, se proporcionó un apoyo efectivo y tangible a las familias afectadas, agilizando su regreso a la normalidad y contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida.

La reconstrucción, en su totalidad, incluyó la construcción desde sus cimientos de una de las viviendas de manera integral, así como la habilitación y transformación de otra, utilizando un antiguo laboratorio.

Estas obras dieron inicio el 9 de septiembre de 2024 y fueron recepcionadas por el Jardín el 20 de diciembre de 2024.





24.04.2024

Entrega de 7 Tarjetas de Reconstrucción Desafío Levantemos Chile a las familias damnificadas.

05.07.2024

Entrega de 3 Tarjetas a los trabajadores



REGISTRO FOTOGRAFICO



09.09.2024





Inicio de obras de construcción de vivienda y
habilitación de antiguo laboratorio como vivienda.

22.11.2024

Se recibe obra completa en vivienda “ex-laboratorio”

20.12.2024


Se recibe obra completa de vivienda nueva.

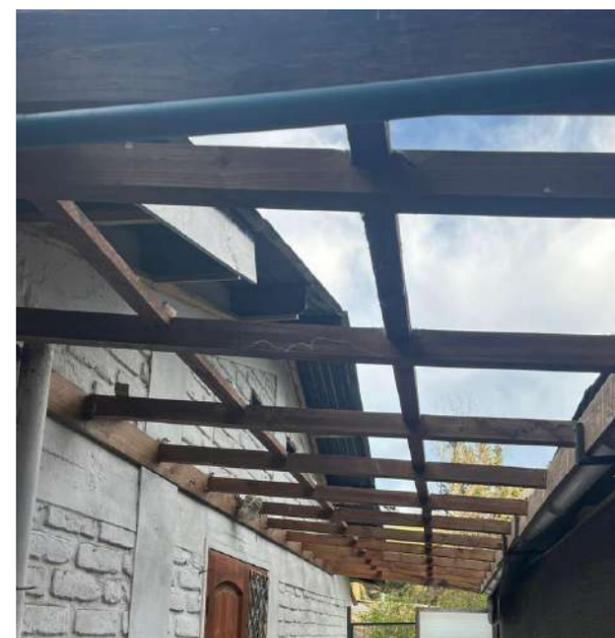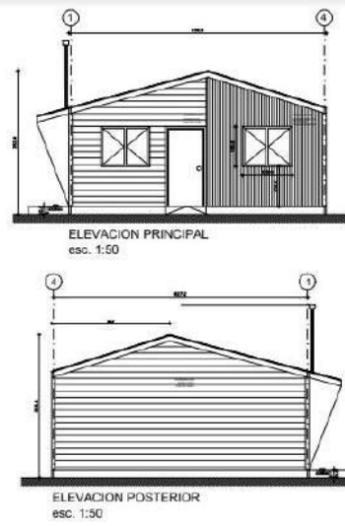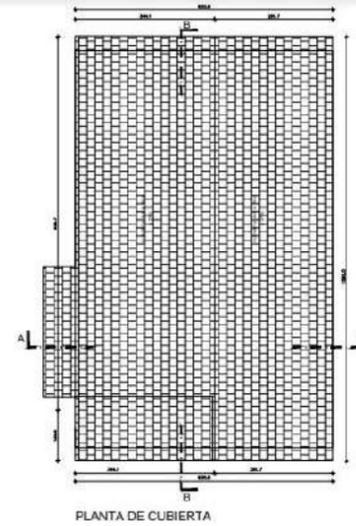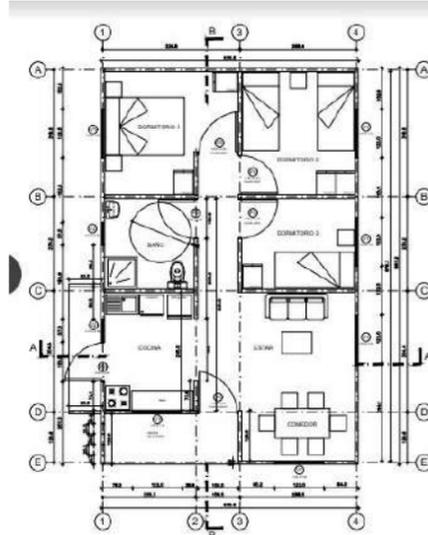

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO

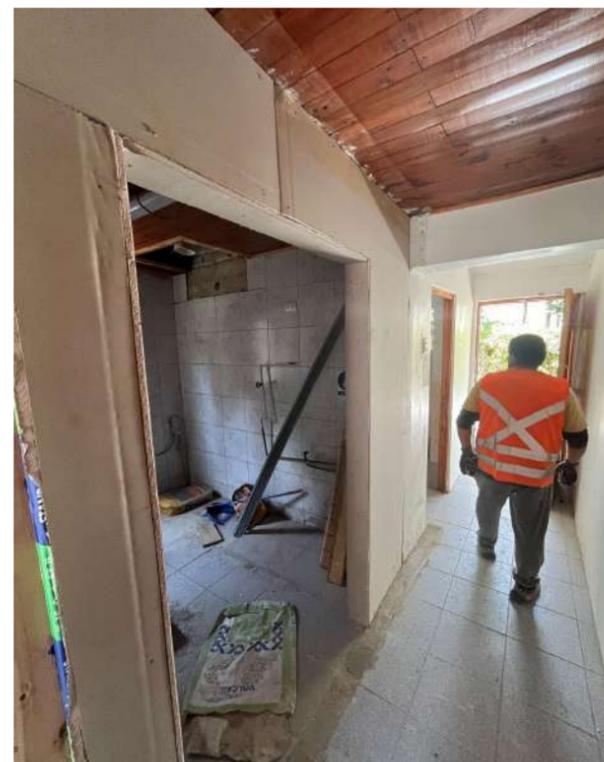



REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO



Abril 2025

**Reconstrucción
Piso de Glorieta
Simbólica y
Pasarela de
Acceso**





Reconstrucción Piso de Glorieta Simbólica y Pasarela de Acceso

La Glorieta es un ícono del lugar como patrimonio histórico-cultural que define al parque, ya que ha sido testigo de eventos que han dejado huella en la historia del jardín y la de sus visitantes. Desafortunadamente fue afectada por el incendio, tanto en sus revestimientos y estética, como en el acceso a la misma.

Se planificó la **recuperación de este espacio** con un plazo de ejecución de un mes, logrando concretarse lo programado el 27 de junio de 2024.

En presencia de Consejo Minero y las autoridades involucradas, se llevó a cabo el hito de entrega de esta emblemática primera obra de la reconstrucción el 7 de agosto de 2024.





10.06.2024

Inicio de obras de pintura, reparación y renovación de la pasarela de acceso al ícono ubicado en la laguna de el Jardín.

26.06.2024

Término de obras.



REGISTRO FOTOGRAFICO

Reconstrucción Total de Cafetería "La Casa del Jardín"





Reconstrucción Total de Cafetería “La Casa del Jardín”

Se llevó a cabo la **reconstrucción integral de la cafetería**, destacándose por su relevancia local como punto de encuentro y su importancia en la atracción de visitantes y la valorización social del espacio, con una construcción característica de los años 30. Este proyecto benefició directamente a los emprendedores, a 10 trabajadoras de la cafetería y a los numerosos clientes que disfrutaban de sus servicios.

Las obras incluyeron la rehabilitación y reconstrucción completa de la estructura, así como mejoras en el interior y el exterior del edificio, la implementación de energización y las conexiones de agua necesarias para las instalaciones sanitarias. Los trabajos fueron entregados oficialmente el 12 de diciembre de 2024, y la entrega formal se realizó el 17 de diciembre del mismo año en un hito comunicacional con la presencia de Consejo Minero y autoridades locales. Desde esa fecha, la cafetería quedó completamente habilitada y en pleno funcionamiento.





19.08.2024

Inicio de obra de rehabilitación y reconstrucción.

05.12.2024

Término de obra Cafetería Casa del Jardín



REGISTRO FOTOGRAFICO



Abril 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



Reconstrucción Canopy Alto Elevar y Muro de Escalada





DETALLE SOLUCIONES

Reconstrucción Canopy Alto Elevar y Muro de Escalada

Ambos espacios son parte de las actividades recreativas y turísticas que recepciona anualmente a cerca de 25.500 personas, teniendo vínculos con colegios, escuelas de verano, residencias de menores y terapias a jóvenes con discapacidad. Además de ser el sustento laboral de 15 personas jefes/as de hogar.

Tras los incendios, presenta un 100% de daños; se propuso su **reconstrucción total** por su vitalidad como espacio de captación de público y fidelización de los visitantes del jardín

Se reciben un 100% de ejecución de obras el 21 de Noviembre de 2024. Se incorporó nuevas obras complementarias de acceso universal, cierre posterior y boletería.





08.07.2024

Inicio de obras.

21.11.2024

Término de obra (Canopy y Muro Escalada)



REGISTRO FOTOGRAFICO




REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO FOTOGRAFICO

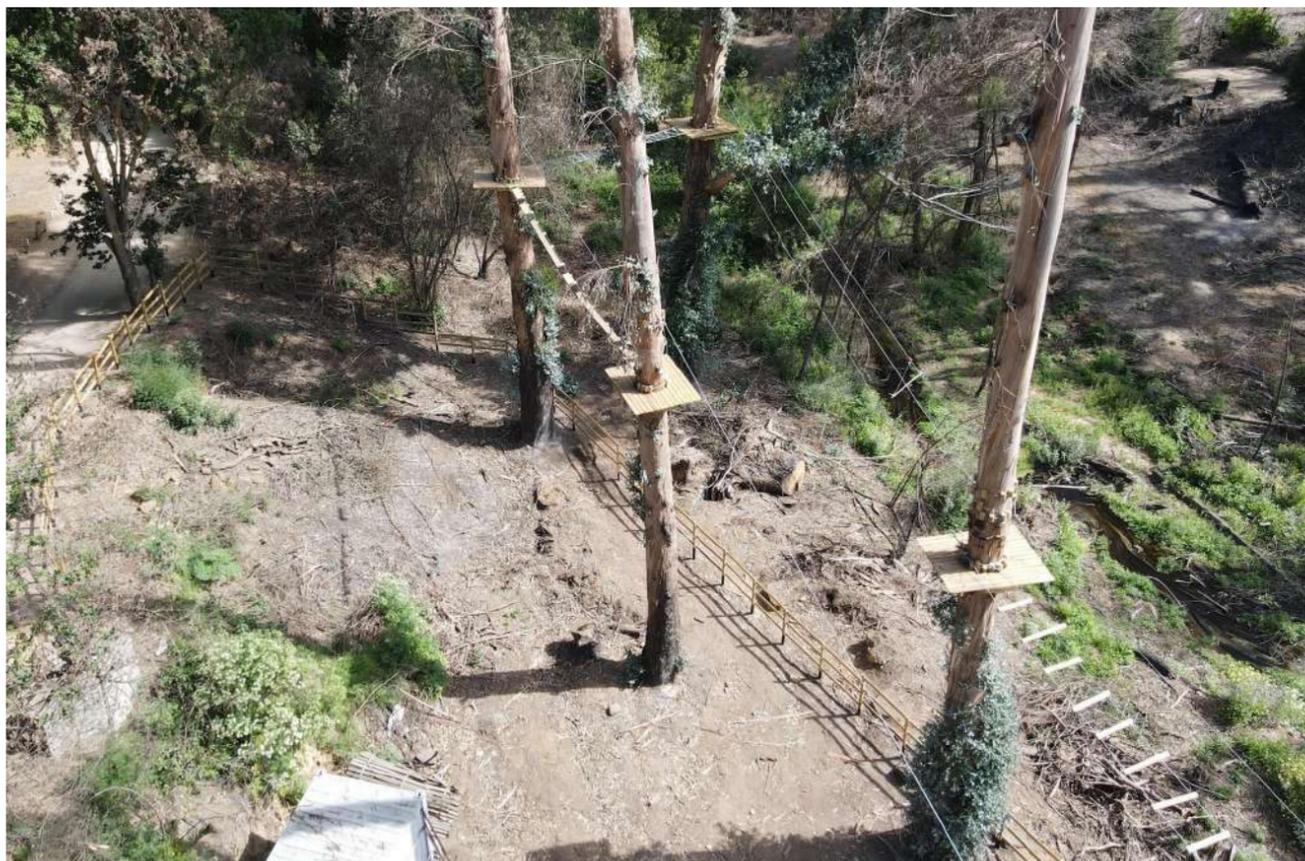

Reconstrucción Sistema de Riego y Vivero Jardín Botánico





Reconstrucción del Sistema de Riego Central del Jardín Botánico Nacional*

El tranque El Cóndor es el principal canal de abastecimiento de agua para regadío de todo el parque y también abastece de agua a todos los baños del Jardín. Su destrucción generó una necesidad predominante.

La iniciativa de reconstrucción consideró **reponer el abastecimiento de agua a la red de riego y baños públicos** dentro del Jardín a la vez que se mejora el sistema de captación de agua y los distintos tramos de distribución.



Reconstrucción Vivero e Invernaderos*

El vivero era un área dedicada a la preservación, estudio y educación dentro del Jardín Botánico, siendo clave para el encuentro entre éste, la comunidad y los establecimientos educacionales. El proyecto contribuyó a la **reconstrucción de su infraestructura de invernadero**, con **su respectivo riego** y espacio de recorrido educacional, para la mantención de las especies nativas. En particular se considera su reacondicionamiento y mejoras, el cerrado del perímetro con mallas, el cambio de mallas tipo “Raschel” en estructuras de viveros y la distribución de red para riego, además de la reconexión a energía eléctrica.

Se finaliza la obra de Sistema de Riego y Vivero el 13 de septiembre pasado.






- 04.06.2024
Inicio de obras.
- 13.09.2024
Término de faenas y entrega de proyecto.
- 14.10.2024 Obras adicionales
Implementación Vivero
En el proceso de cierre de este proyecto, se ha decidido agregar la **implementación** de todos los invernaderos, equipándose tanto con materiales como con herramientas de trabajo. Además, se llevará a cabo la construcción de mesas de trabajo, las cuales estarán finalizadas para la primera semana de noviembre.
- 12.11.2024
Se entrega **Manual, tríptico y mapa de riego** a encargados de Jardín Botánico donde se capacito al personal sobre la correcta mantención del sistema de riego.



DETALLE SOLUCIONES




REGISTRO FOTOGRAFICO

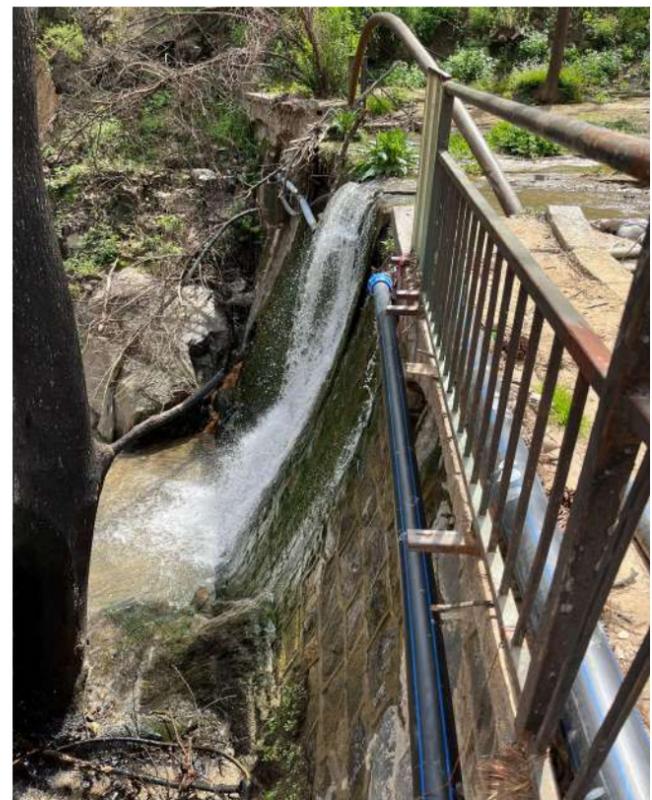



REGISTRO FOTOGRAFICO

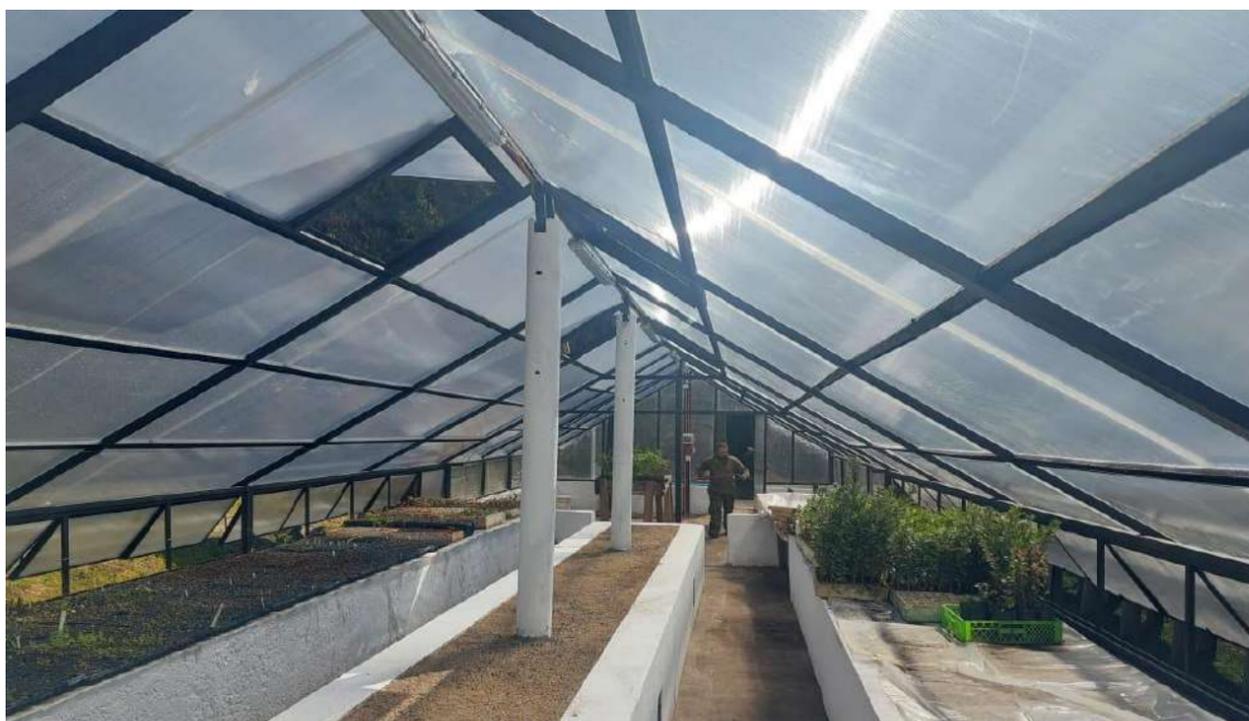



REGISTRO FOTOGRAFICO





AHORA LA EMERGENCIA SON LOS INCENDIOS



Desafío
Levantemos Chile



EN
ACCIÓN
CON

Banco de Chile

cmpc



RESULTADOS CONSOLIDADOS: Plan de comunicaciones

- 01 PÚBLICO GENERAL**
- Gestión de prensa
 - Redes sociales

- 02 PÚBLICO REGIONAL**
- Gestión de prensa

- 02 PÚBLICO INTERNO**
- Páginas sociales
 - Newsletter LinkedIn
 - Newsletter Reporte Anual
 - Redes sociales

INDICADORES GESTIÓN DE PRENSA:

Distribución de **88 menciones orgánicas** entre marzo de 2024 y febrero de 2025:

- **Prensa escrita:** 11 en total
 - El Mercurio: Menciones [1](#), [2](#), [3](#) y [4](#).
 - Diario Financiero: [1 mención](#).
 - La Tercera: Menciones [1](#), [2](#) y [3](#).
 - LUN: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Portal Minero: [1 mención](#).
- **Radio:** 3 en total
 - Radio Biobío: [1 mención](#).
 - Cooperativa: [1 mención](#).
 - Radio Agricultura: [1 mención](#).
- **TV:** 3 en total
 - CNN Chile: [1 mención](#).
 - 13 C: Menciones [1](#) y [2](#) (repetición).
- **Portales online:** 71 en total
 - AD Prensa: [1 mención](#).
 - Alerta Noticias: [1 mención](#).
 - Biobío Chile: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Chile Desarrollo Sustentable: [1 mención](#).
 - Cooperativa: [1 mención](#).
 - Cooperativa Ciencia: [1 mención](#).
 - Cual es tu Huella: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Debo Saber: [1 mención](#).
 - Desarrollo Social y Familia: [1 mención](#).
 - Diario de Santiago: [1 mención](#).
 - DLCh: [1 mención](#).
 - El Ciudadano: [1 mención](#).
 - El Desconcierto: [1 mención](#).
 - El Dínamo: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Está Pasando: [1 mención](#).
 - Extra Noticias: Menciones [1](#) y [2](#).
 - G5 Noticias: [1 mención](#).
 - Gob CL: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Guía Minera: Menciones [1](#), [2](#) y [3](#).
 - Infogate: [1 mención](#).
 - La Tercera: [1 mención](#).
 - Mediabanco: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Minería Chilena: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Minería Local: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Ministerio de Hacienda: [1 mención](#).
 - MSN: [1 mención](#).
 - Onda Digital: [1 mención](#).
 - Portal Innova: [1 mención](#).
 - Portal Metropolitano: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Portal Minero: Menciones [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#) y [8](#).
 - Portal Red Salud: [1 mención](#).
 - Publimicro: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Pulso – La Tercera: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Pura Noticia: [1 mención](#).
 - Radio ADN: [1 mención](#).
 - Radio Agricultura: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Radio Pauta: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Redimin: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Reporte Diario: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Reporte Minero: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Transporte Terrestre: [1 mención](#).
 - Rock&Pop: [1 mención](#).
 - T13: [1 mención](#).
 - Terram: [1 mención](#).
 - Tour Innovación: [1 mención](#).

REDES SOCIALES:

Publicaciones destacadas:



Carrusel Hito n°1: 22-04-24

Accesos

[Ver en Instagram](#)

[Ver en Facebook](#)

[VER RESULTADOS CONSOLIDADOS](#)



Carrusel Hito n°2: 07-08-24

Accesos

[Ver en Instagram](#)

[Ver en Facebook](#)

[Ver en LinkedIn](#)

[VER RESULTADOS CONSOLIDADOS](#)



Reel Hito n°5: 30-12-24

Publicación colaborativa con Antofagasta Minerals en Instagram

Accesos

[Ver en Instagram](#)

[Ver en Facebook](#)

[VER RESULTADOS CONSOLIDADOS](#)

INDICADORES GESTIÓN DE PRENSA:

Distribución de **57 menciones orgánicas** entre abril de 2024 y febrero de 2025:

- **Prensa escrita:** 14 en total
 - El Mercurio de Valparaíso: Menciones [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#) y [7](#).
 - El Observador de Quillota: [1 mención](#).
 - La Estrella de Valparaíso: Menciones [1](#), [2](#), [3](#), [4](#) y [5](#).
 - El Diario de Atacama: [1 mención](#).
- **Radio:** 7 en total
 - Radio Biobío Valparaíso: Menciones [1](#), [2](#) y [3](#).
 - Radio Festival: [1 mención](#).
 - Radio Universidad de Valparaíso: [1 mención](#).
 - Radio Valparaíso: Menciones [1](#) y [2](#).
- **TV:** 2 en total
 - Quintavisión: [1 mención](#).
 - TVN Red Valparaíso: [1 mención](#).
- **Portales online:** 34 en total
 - 24 Horas: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Alerta Noticias: [1 mención](#).
 - Diario El Lector: [1 mención](#).
 - El América: Menciones [1](#) y [2](#).
 - El Observador Online: [1 mención](#).
 - Epicentro Chile: [1 mención](#).
 - G5 Noticias: Menciones [1](#), [2](#), [3](#), [4](#) y [5](#).
 - La Región Hoy: [1 mención](#).
 - Margamarga Online: Menciones [1](#) y [2](#).
 - Quilpué Online: [1 mención](#).
 - Quintavisión: [1 mención](#).
 - Radio Allen: [1 mención](#).
 - Radio Stella Maris: [1 mención](#).
 - Radio Valparaíso: [1 mención](#).
 - Red Noticias: [1 mención](#).
 - Soy Valparaíso: Menciones [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#) y [6](#).
 - Timeline: [1 mención](#).
 - Tú Opinas: [1 mención](#).
 - TV Región: [1 mención](#).
 - UCV Radio: [1 mención](#).
 - La Tercera: [1 mención](#).
 - Universidad de Valparaíso: [1 mención](#).
 - Valparaíso Informa: [1 mención](#).



Portada El Mercurio de Valparaíso 18-12-24



Nota TVN Red Valparaíso 12-12-24



Nota Quintavisión 08-08-24

INDICADORES GENERALES:

Páginas sociales:



El Mercurio 19-12-24



El Mercurio de Valparaíso 19-12-24

Newsletter LinkedIn:

Análisis de la publicación

Consejo Minero De Chile A G ha publicado esto • 8 meses

Te invitamos a leer una nueva edición de nuestro newsletter 'Minería con otros ojos', en donde compartimos el trabajo realizado junto a nuestras empresas socias para recuperar el Jardín Botánico de Viña del Mar.

Reforestando el futuro: avanza la reconstrucción del Jardín Botánico de Viña del Mar
Consejo Minero De Chile A G en LinkedIn • 3 min de lectura

Dirigido a: todos los seguidores

Descubrimiento orgánico

5.257	3.838
Impresiones	Miembros alcanzados

Amplifica tu alcance
Promociona esta publicación para obtener 250.000 impresiones más

Promocionar

Interacción orgánica

88	1.7 %
Interacciones	Tasa de interacción
Clics	29
Porcentaje de clics	0.6 %
Reacciones	48 →
Comentarios	7 →
Veces compartido	4 →

Publicación 25-09-24

Análisis de la publicación

Consejo Minero De Chile A G ha publicado esto • 5 meses

Durante este mes destacamos la entrega de la cafetería, canopy y sistema de riego del Jardín Botánico de Viña del Mar, parte un proyecto de reconstrucción que ha sido posible gracias al aporte de nuestras empresas socias **Anglo American Chile**.

Proyecto de recuperación del Jardín Botánico: empresas socias del Consejo Minero celebraron la reconstrucción de l...
Consejo Minero De Chile A G en LinkedIn • 4 min de lectura

Dirigido a: todos los seguidores

Descubrimiento orgánico

6.720	4.987
Impresiones	Miembros alcanzados

Amplifica tu alcance
Promociona esta publicación para obtener 250.000 impresiones más

Promocionar

Interacción orgánica

116	1.7 %
Interacciones	Tasa de interacción
Clics	56
Porcentaje de clics	0.8 %
Reacciones	52 →
Comentarios	6 →
Veces compartido	2 →

Publicación 30-12-24

Newsletter Reporte Anual:

Email performance

8 May 2025 - 28 May 2025 • Excludes Apple MPP

Open rate 22.7% 583 opened	Click rate 4.6% 117 clicked	Bounce rate 2.2% 59 bounced	Unsubscribe rate 0.04% 1 unsubscribed
---	--	--	--

Additional email details

Deliveries	2,565 (97.8%)	Clicks per unique opens	20.1%
Total opens	1,048	Total clicks	1,018
Last opened	28 May 2025 1:10 pm	Last clicked	17 May 2025 5:29 pm
Forwarded	0	Abuse reports	0

INDICADORES GENERALES:

RR.SS.:



Carrusel voluntariado corporativo n°1: 29-08-24

Publicación colaborativa con Jardín Botánico en Instagram.

Accesos
Ver en Instagram
Ver en Facebook
Ver en LinkedIn
VER RESULTADOS CONSOLIDADOS



Reel voluntariado corporativo n°1: 09-09-24

Accesos
Ver en Instagram
Ver en Facebook
Ver en LinkedIn
VER RESULTADOS CONSOLIDADOS



Carrusel voluntariado corporativo n°2: 30-10-24

Accesos
Ver en Instagram
Ver en Facebook
Ver en LinkedIn
VER RESULTADOS CONSOLIDADOS
